



- fjordar for framtida

23.02.2026



2 Status fremdrift - Renseanlegg

Status bergarbeider



Vei- og fortausarbeider ferdig

Sprenging av berghallene ferdig og massetransport ferdig.

E21 – Bygningsmessige arbeider, har rigget sin riggplass og er ny hovedbedrift.

Arbeider med pipe: Boring for begge pipeløp er ferdig, Ø2500mm

Inntaks- og utløpsledninger ferdig lagt i hele strekket i kjøretunell, kryssing av veg om ikke lenge.


Arbeider med duk i taket er kommet langt

Betongarbeider for bassenger osv, er startet for fullt. MBBR-bassengene (8m høye) godt på vei.

Alt dette ligger iht og litt foran fremdriftsplan

2 Renseanlegg

Status bergarbeider

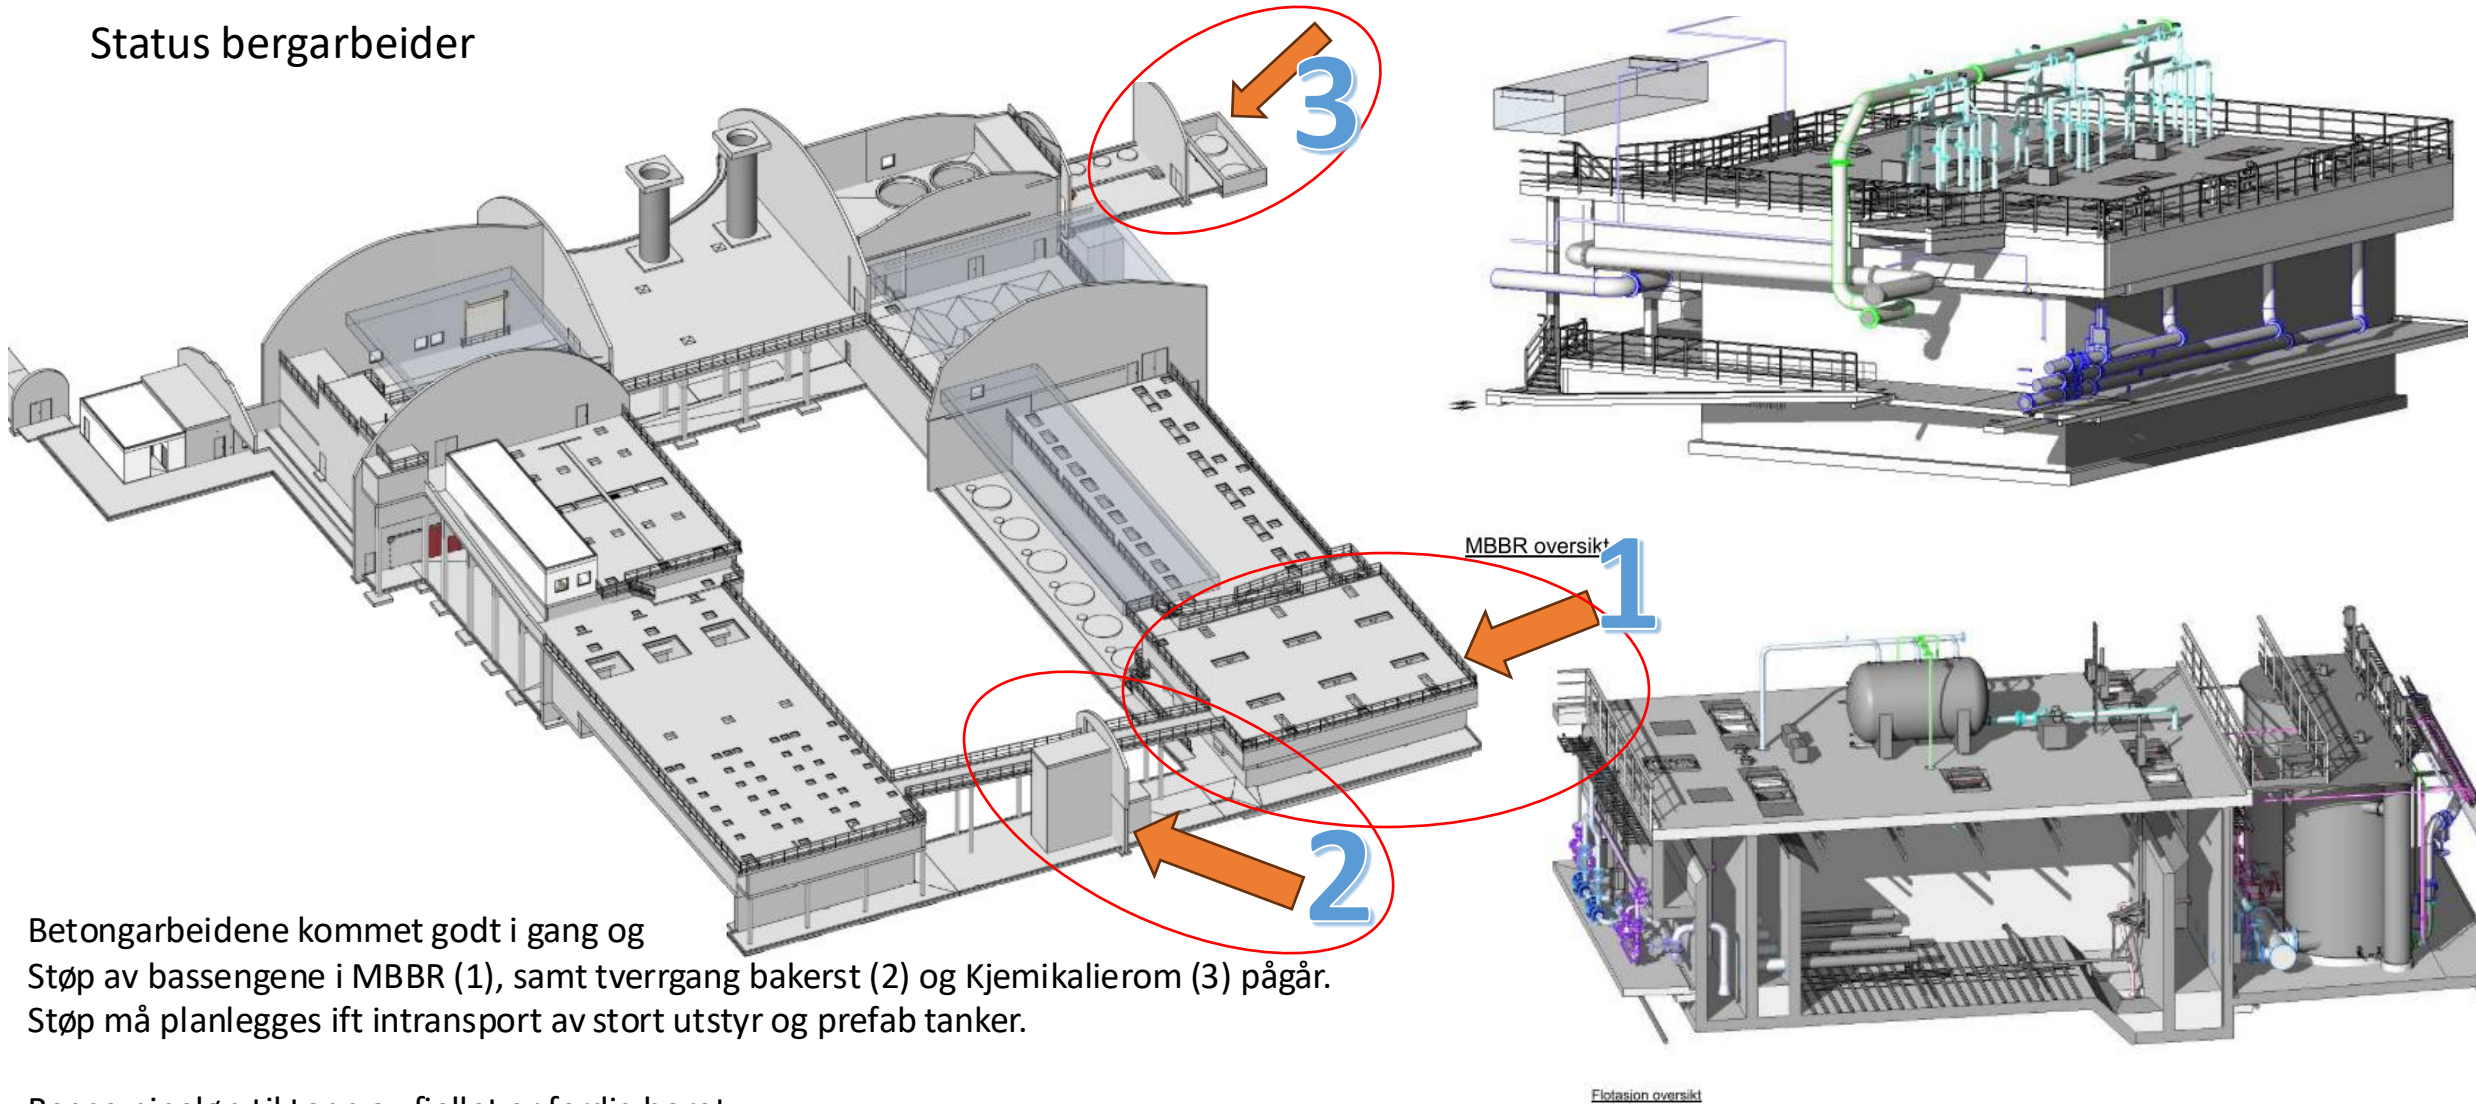


Betongarbeidene kommet godt i gang og Støp av bassengene i MBBR (1), samt tverrgang bakerst (2) og Kjemikalieområde (3) pågår. Støp må planlegges ift intransport av stort utstyr og prefab tanker.

Begge pipeløp til topp av fjellet er ferdig boret. Stor jobb med rørføringer ut/inn av anlegget startet.

2 Renseanlegg

MBBR – Tverrforbindelse - Kjemikalierom:

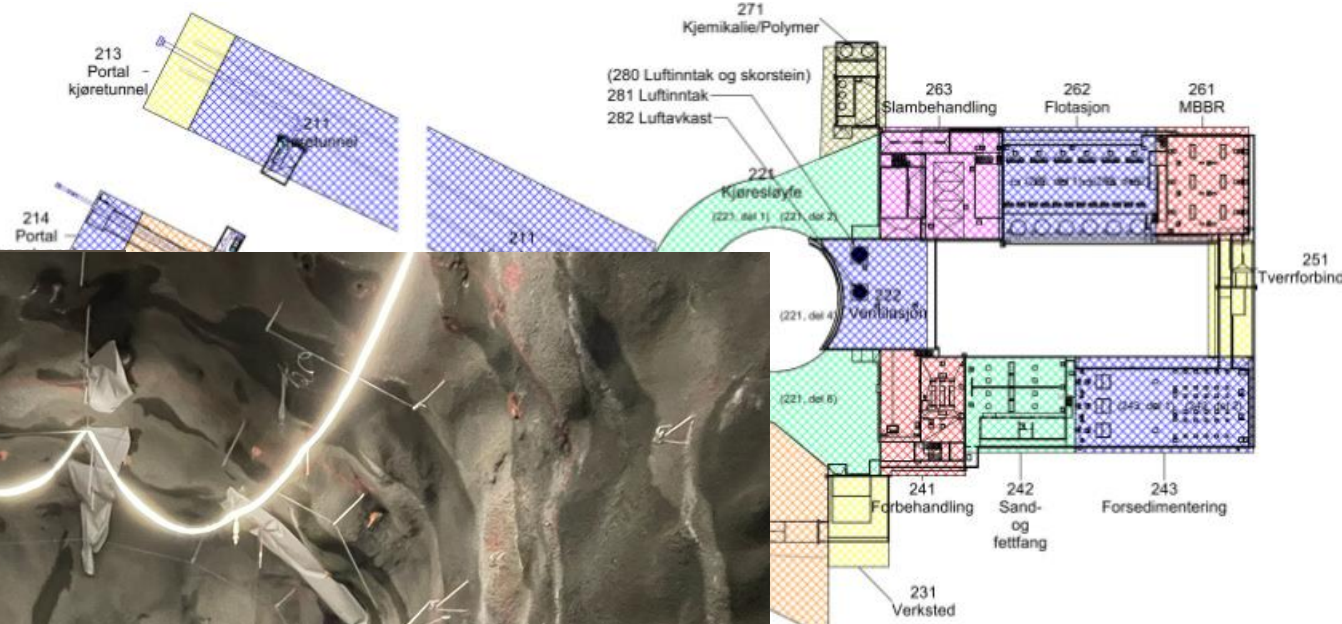


2 Renseanlegg

Innløps- og utløpsledninger i kjøretunell, inntak/avkast:





2 Renseanlegg

Maskin- og prosessmontasje fra medio september 26:

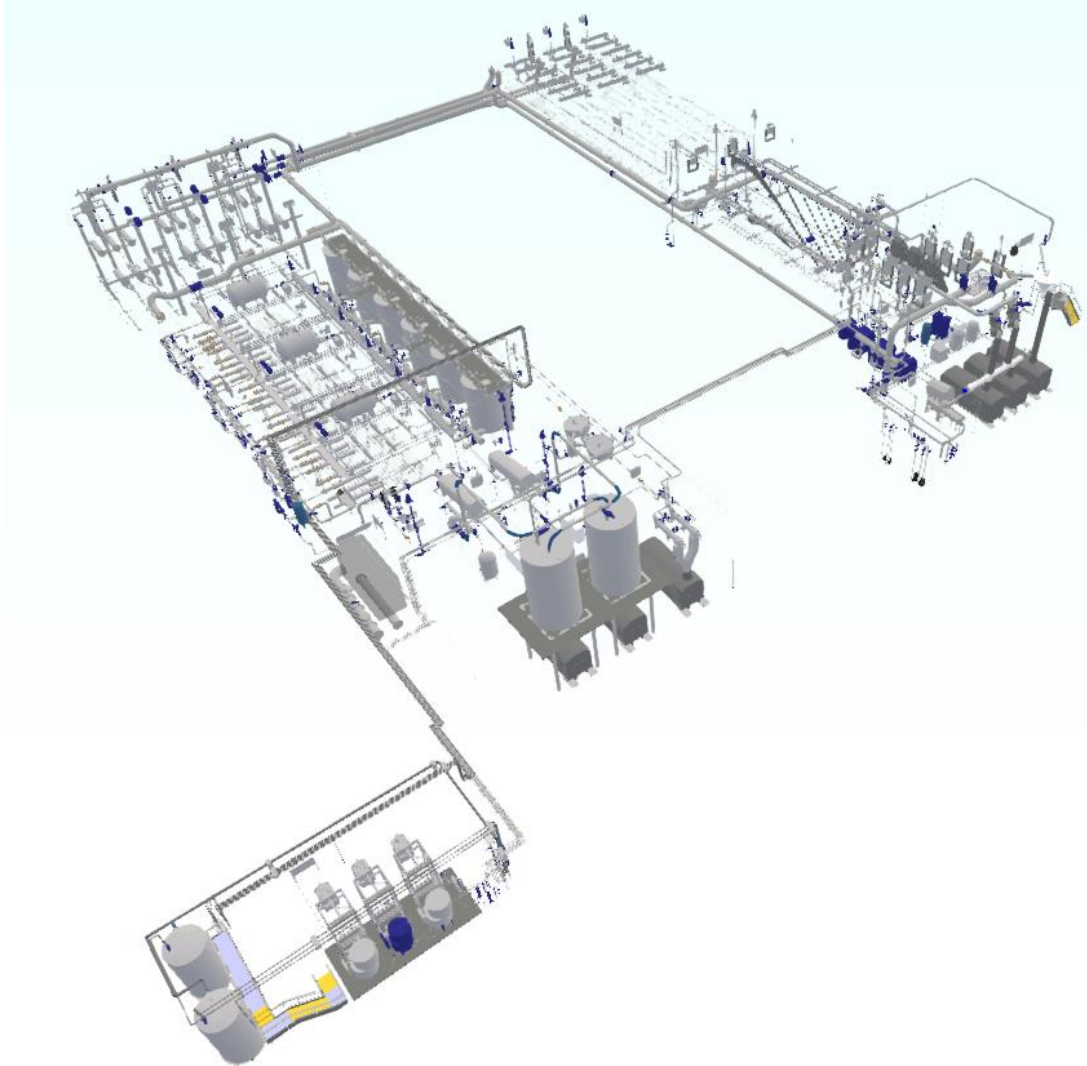

Alt dette Maskin- og prosessutstyret for rensing av avløpsvannet vårt, skal tilpasses betongkonstruksjoner, elektro, ventilasjon, samt automasjon, for å få et helhetlig og godt fungerende rensesanlegg.



PS Larsgården:

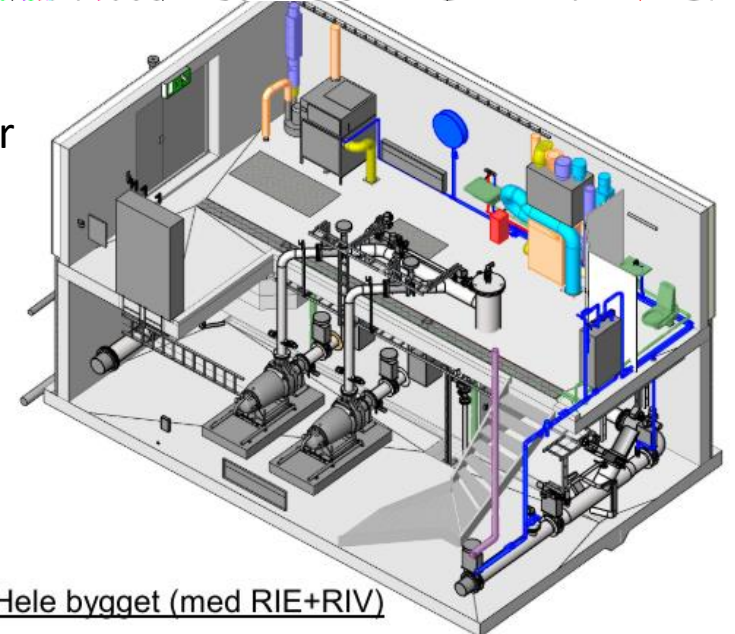

Hele bygget (med RIE+RIV)


3 Status Fremdrift - Overføringsanlegget

PS Breivika:

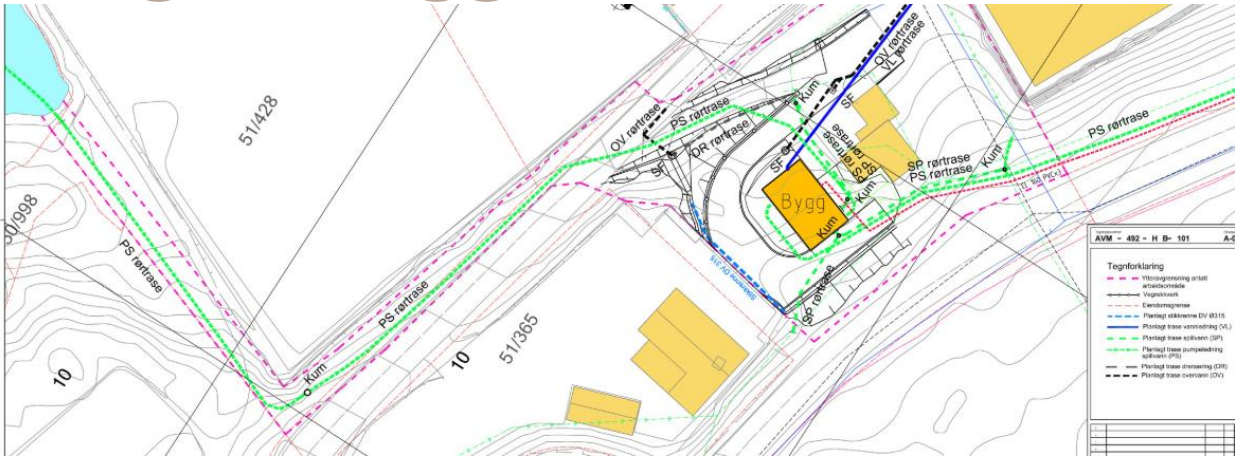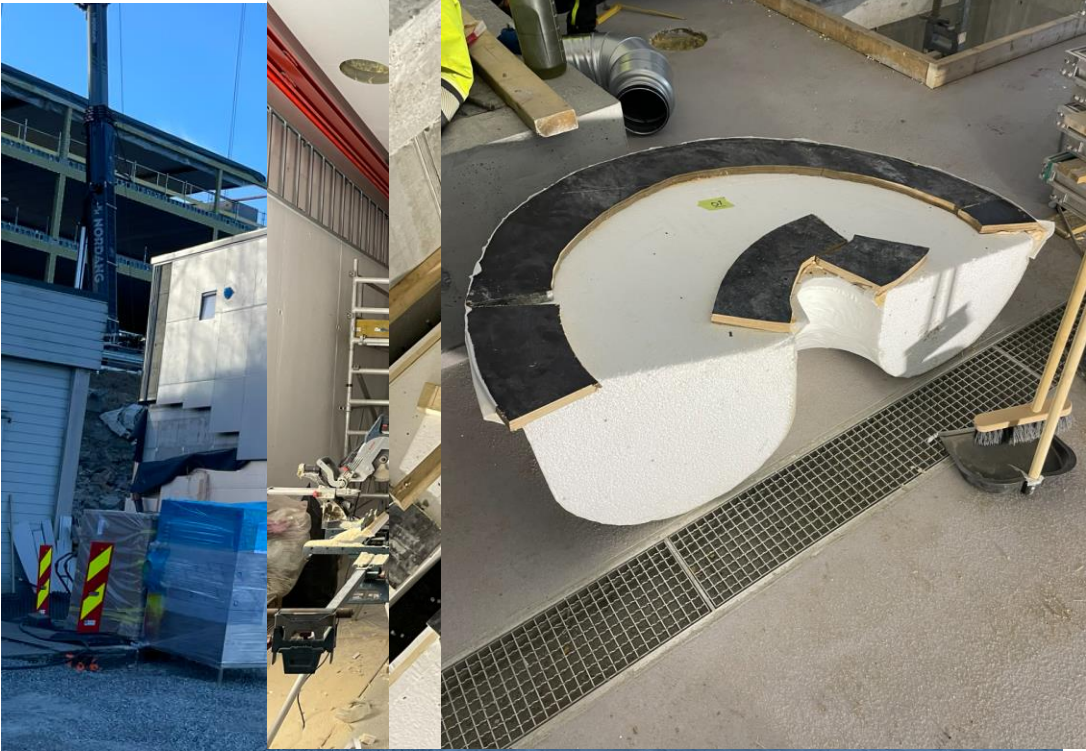

Det bygningsmessige er ferdig
Enkelte elementer (som dører avventes til ferdig montert maskin og prosess)
- Montasje maskin- og prosess fra 02.03.2026

PA050 Breivika	25.02.2025	03.12.2026	
Oppstart bygging	25.02.2025	25.02.2025	25.02.2025
Grunnarbeid, oppstart betong	25.02.2025	13.10.2025	
Mottak innstøpingsgods fra E62	13.10.2025	13.10.2025	
Ferdigstillelse bygg	14.10.2025	16.02.2026	
Bygg inkl. overflatebehandling klart til E62/ES1	26.02.2026	26.02.2026	
Tekniske installasjoner + utomhus	02.03.2026	16.06.2026	
Ferdigstillelse utomhus	16.06.2026	16.06.2026	
Tekniske installasjoner	17.06.2026	03.12.2026	
Klar til oppstart prøvedrift	03.12.2026	03.12.2026	

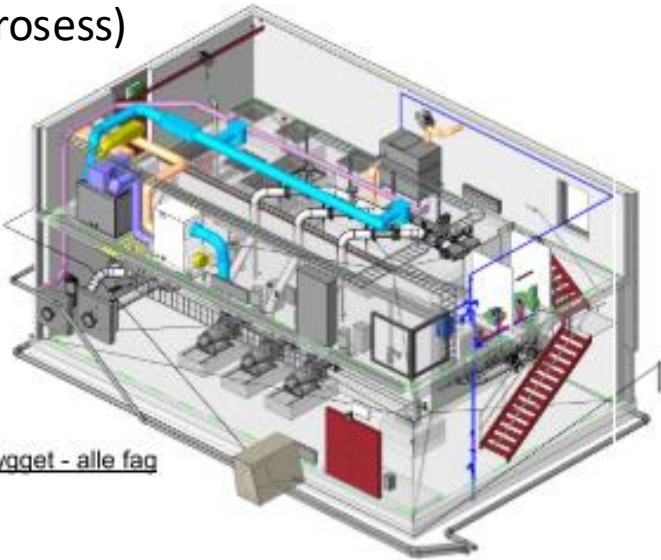


1 Status Fremdrift - Overføringsanlegget

Overføringsledning over Moa:





Oppstart graving jun 25, ferdig ila 2026

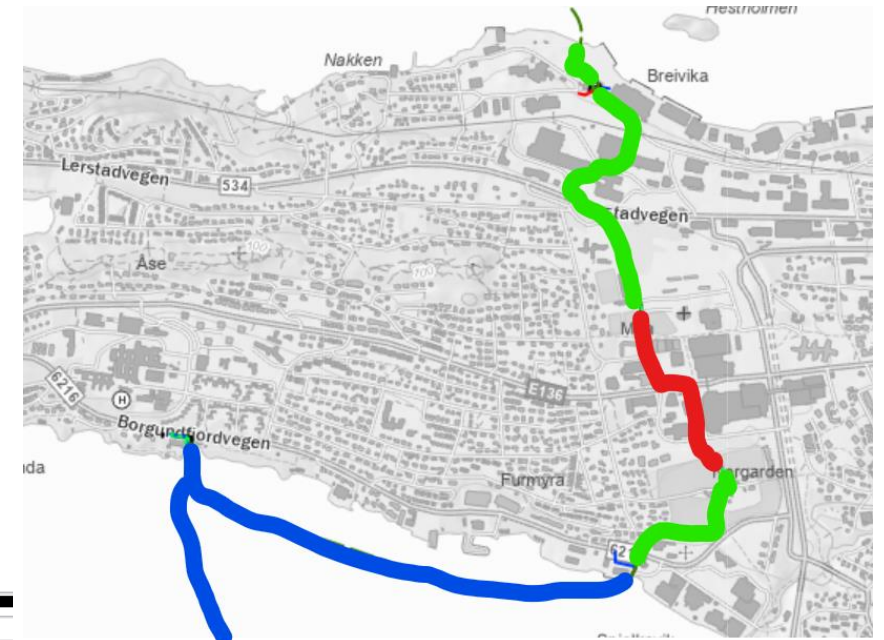



E73 Ledning over Moa				
Kontraktinngåelse	21.05.2025	01.07.2027		
Oppstart bygging	21.05.2025	21.05.2025		
Utførelse bortrase Borgundfjordvegen	21.05.2025	04.09.2025		
Ferdigstilt bortrase Borgundfjordvegen	04.09.2025	04.09.2025		
Utførelse ledningstrase 493 Breivika - Moa	21.05.2025	27.02.2026		
Klar for tilkobling mot PA050 Breivika	27.02.2026	27.02.2026		
Utførelse ledningstrase 495 Moa - Borgundfjordvegen	02.03.2026	07.05.2027		
Ferdigstillelse	01.07.2027	01.07.2027		

Ventilhus Borgundfjordvegen:

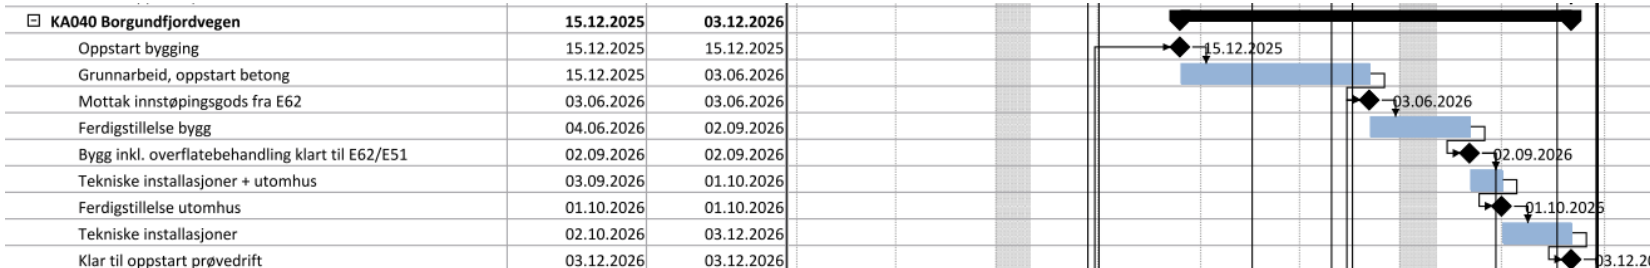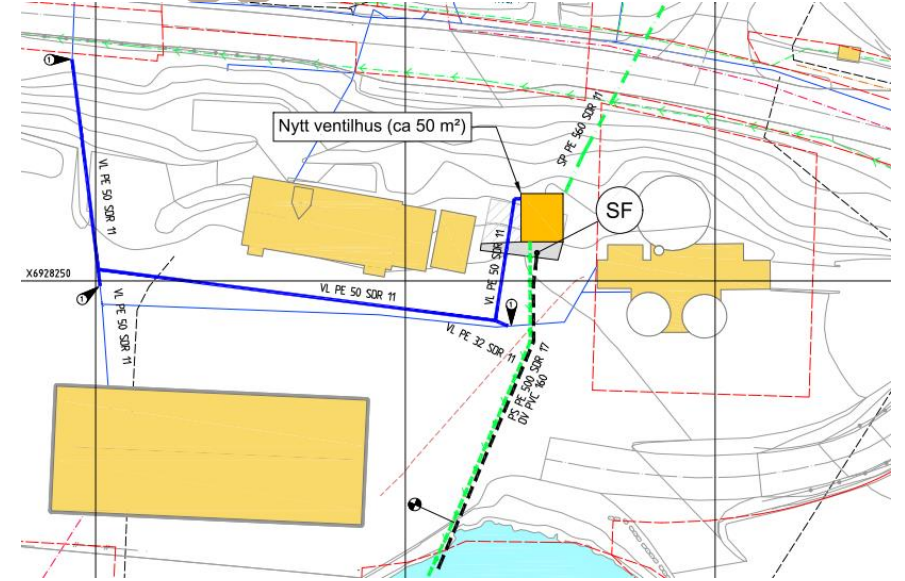

3 Status Fremdrift - Overføringsanlegget

PS Åse:

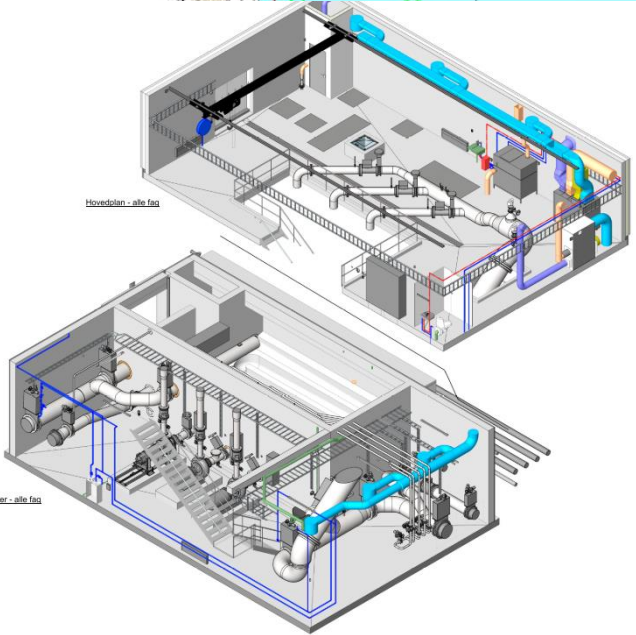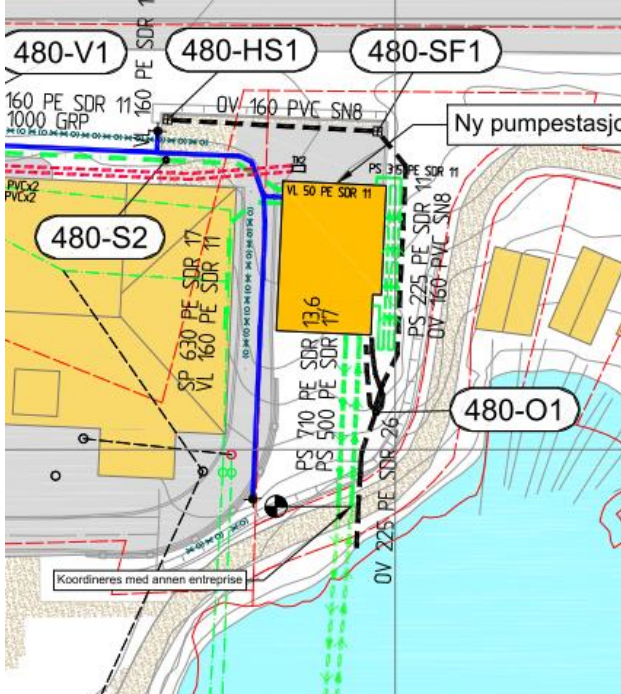

PA040 Åse	25.02.2025	03.12.2026	
Oppstart bygging	25.02.2025	25.02.2025	25.02.2025
Grunnarbeid, oppstart betong	25.02.2025	10.10.2025	
Mottak innstøpingsgods fra E62	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025
Ferdigstillelse bygg	14.10.2025	07.04.2026	
Bygg inkl. overflatebehandling klart til E62/E51	07.04.2026	07.04.2026	07.04.2026
Tekniske installasjoner + utomhus	08.04.2026	12.10.2026	
Ferdigstillelse utomhus	12.10.2026	12.10.2026	12.10.2026
Tekniske installasjoner	13.10.2026	03.12.2026	
Klar til oppstart prøvedrift	03.12.2026	03.12.2026	03.12.2026

3 Status Fremdrift - Overføringsanlegget


Borehull Stafsethneset:



Oppstart graving/sprenging Q1-26
Oppstart boring feb 26
Ferdig borhull før ferien.




451 Stafsetneset - Kongshaugen	02.01.2026	04.06.2026
Byggestart	02.01.2026	02.01.2026
Grunnarbeid byggegrøp kum, ilandføringsgrøft	02.01.2026	02.03.2026
Klargjort ilandføringsgrøft og byggegrøp kum	02.03.2026	02.03.2026
Byggetid	03.03.2026	04.06.2026
Ferdigstillelse	04.06.2026	04.06.2026



3 Status Fremdrift - Overføringsanlegget

Sjøledninger:

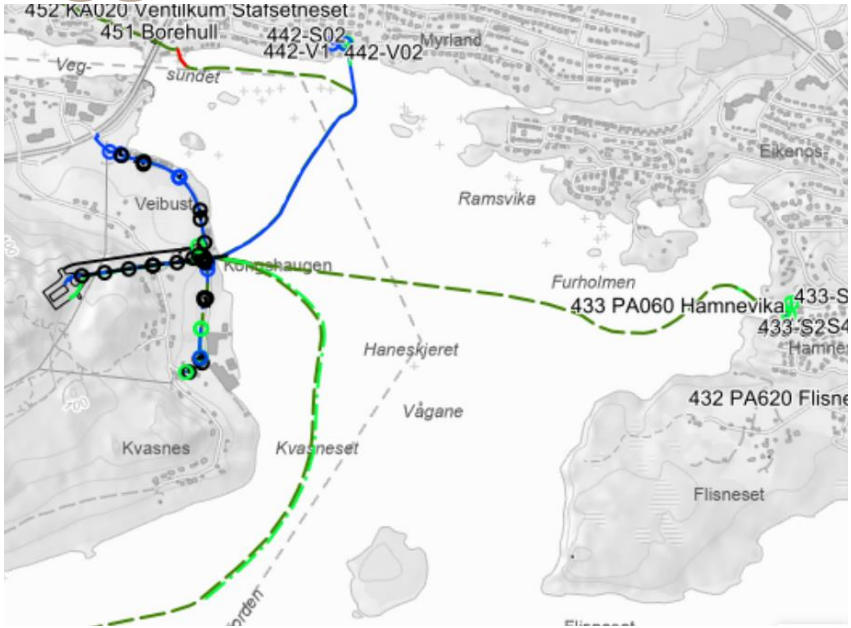

Aktivitetsnavn	Gjeldende start	Gjeldende slutt	2025				2026				2027
			Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1
☒ Ledningsstrekk	01.08.2025	23.12.2027									
412 Nødoverløpsledning	01.08.2025	10.12.2025									
413 Utslippsledning	01.08.2025	10.12.2025									
421 Sunde - Kongshaugen	11.03.2027	26.08.2027									
430 Hamnevik - Kongshaugen	11.03.2027	26.08.2027									
442 Vegsundet vannledning inkl. landtak	01.08.2025	10.12.2025									
451 Stafsetneset inkl. landtak - Kongshaugen	01.08.2025	10.12.2025									
471 Langevåg Molvær - Sulatunet	19.08.2027	23.12.2027									
471 Langevåg Stadsneset - Åregjerdevågen	19.08.2027	23.12.2027									
471 Urkevika - Djupvika	04.08.2026	23.12.2026									
475 Djupvika - Tørla	04.08.2026	23.12.2026									
475 Tørla - Stafsetneset	04.08.2026	23.12.2026									
481 Åse - Stafsetneset	04.08.2026	23.12.2026									
482 Åse - Borgundfjordvegen	04.08.2026	23.12.2026									
491 Larsgården - Breivika	11.03.2027	26.08.2027									

5 sjøledninger ferdig lagt.
Nest «bolc» høsten 26.


3 Overordnet planlagt fremdrift - OFA



- Sjøledning Larsgården – Breivika skyves frem til Q2-2026
- PA Djupvika utsatt fra sommer/høst 25 til vår 26
- PA Larsgården skjøvet frem fra Q1-26 til Q3-25.
- Landledning Sula utsatt oppstart fra jan-26 til Q2-26.
- Overstående gir utslag i at det er har vært vanskelig å komme i gang med arbeider på Sula (med unntak av selve renseanlegget) og arbeider blir derfor skjøvet frem i tid i Ålesund. All investering er derfor igangsatt i Ålesund, litt før opprinnelig planlagt.
- PA Djupvika blir nå igangsatt i starten av mars 26.

3 Status Fremdrift - OFA

Ledninger og oversikt:

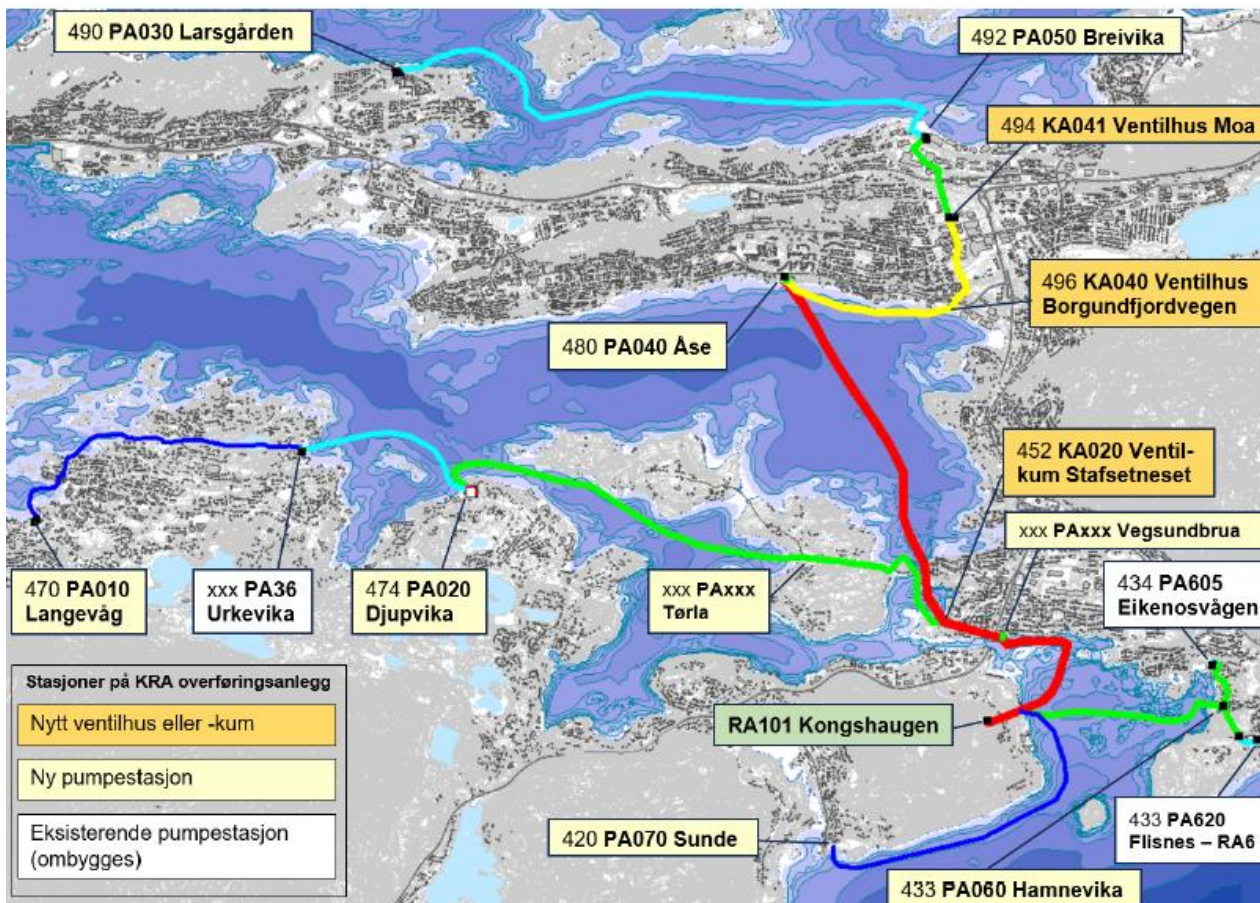

Strekket:

- PA030 Larsgården
- Sjøledning Larsgården – Breivika
- PA050 Breivika
- Landstrekke Breivika – Moa
- Ventilkum Moa (ved Spjekavik kirke)
- Landstrekke Breivika til Borgundfjorden
- Ventilkum Borgundfjordvegen
- Sjøledning Borgundfjordvegen – Åse
- PA040 Åse
- Sjøledning Åse-Stafsethneset
- Landledning Stafsethneset
- Sjøledning Vegsundstranda til Renseanlegget

...vil i det store og det hele være ferdig ila 2026, tidlig 2027. Altså investeringene som er eksklusive for Ålesund for OFA vil være tatt.

(Eksklusiv Sone 6 PA060 Hamnevika og Flisnes)
