




BLÅ

- fjordar for framtida




Pumpehus - plassering

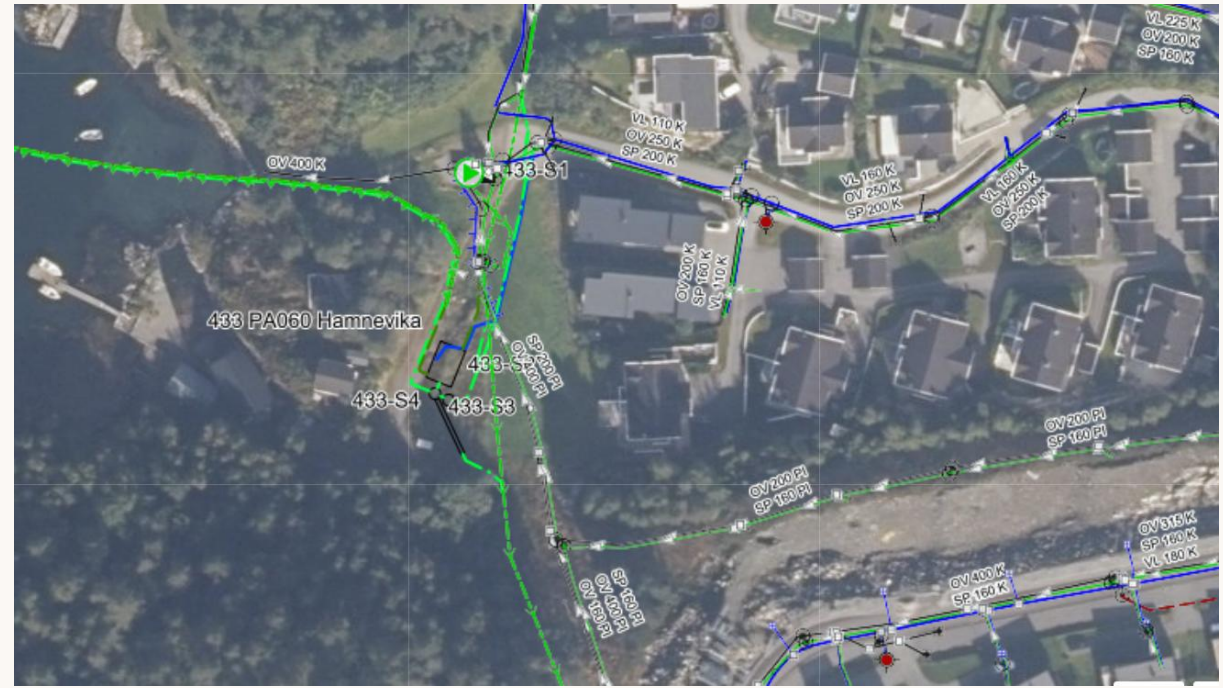


- Det ligger pr i dag mye ledninger i bakken som møtes i Hamnevik
- Kommer både fra Øllsvikveien, Eikenosvågen, Flisnesvegen osv.
- Det er derfor et knutepunkt under bakken, som må frakte vannet videre.
- Vannet fraktes fra 2028 videre til Kongshaugen Reinseanlegg for en mye bedre rensing enn tidligere.



Pumpehus - utforming

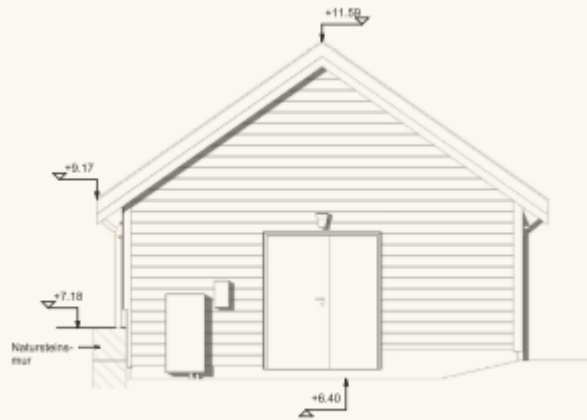

Nordøst
1 : 50

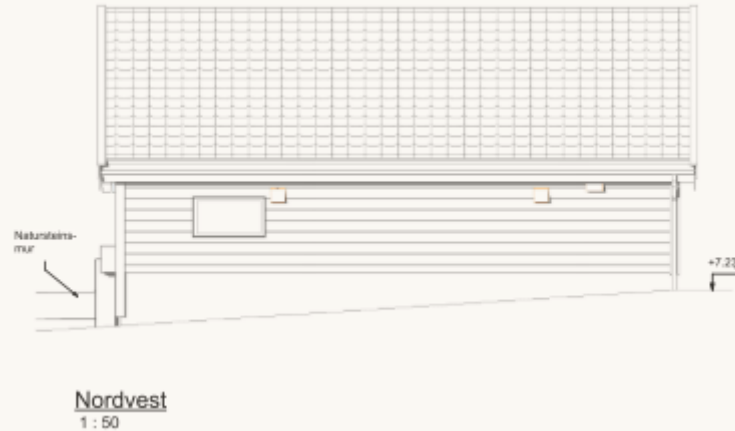

Nordvest
1 : 50




Perpektiv fra nord

- Den bygges med liggende kledning, royalimpregnert grå, for dempet inntrykk. Saltak med takpanner av stål, sort eller grå farge.
- Stasjonen er lagt ned i terrenget for at ikke den skal dominere for mye
- Lukket anlegg uten lukt eller støy.
- Akebakke har vært fokuspunkt og terrengvoller skal hindre farlige situasjoner.
- Det har vært forøkt å plassere den mest mulig usentralt i friområdet og i forbindelse med allerede etablert vei.
- Eksisterende pumpestasjon og tilhørende murer fjernes og reetableres med gress. Dette kan først gjøre i 2028, når vannet overføres til nytt renseanlegg.




Pumpehus - Riggplan

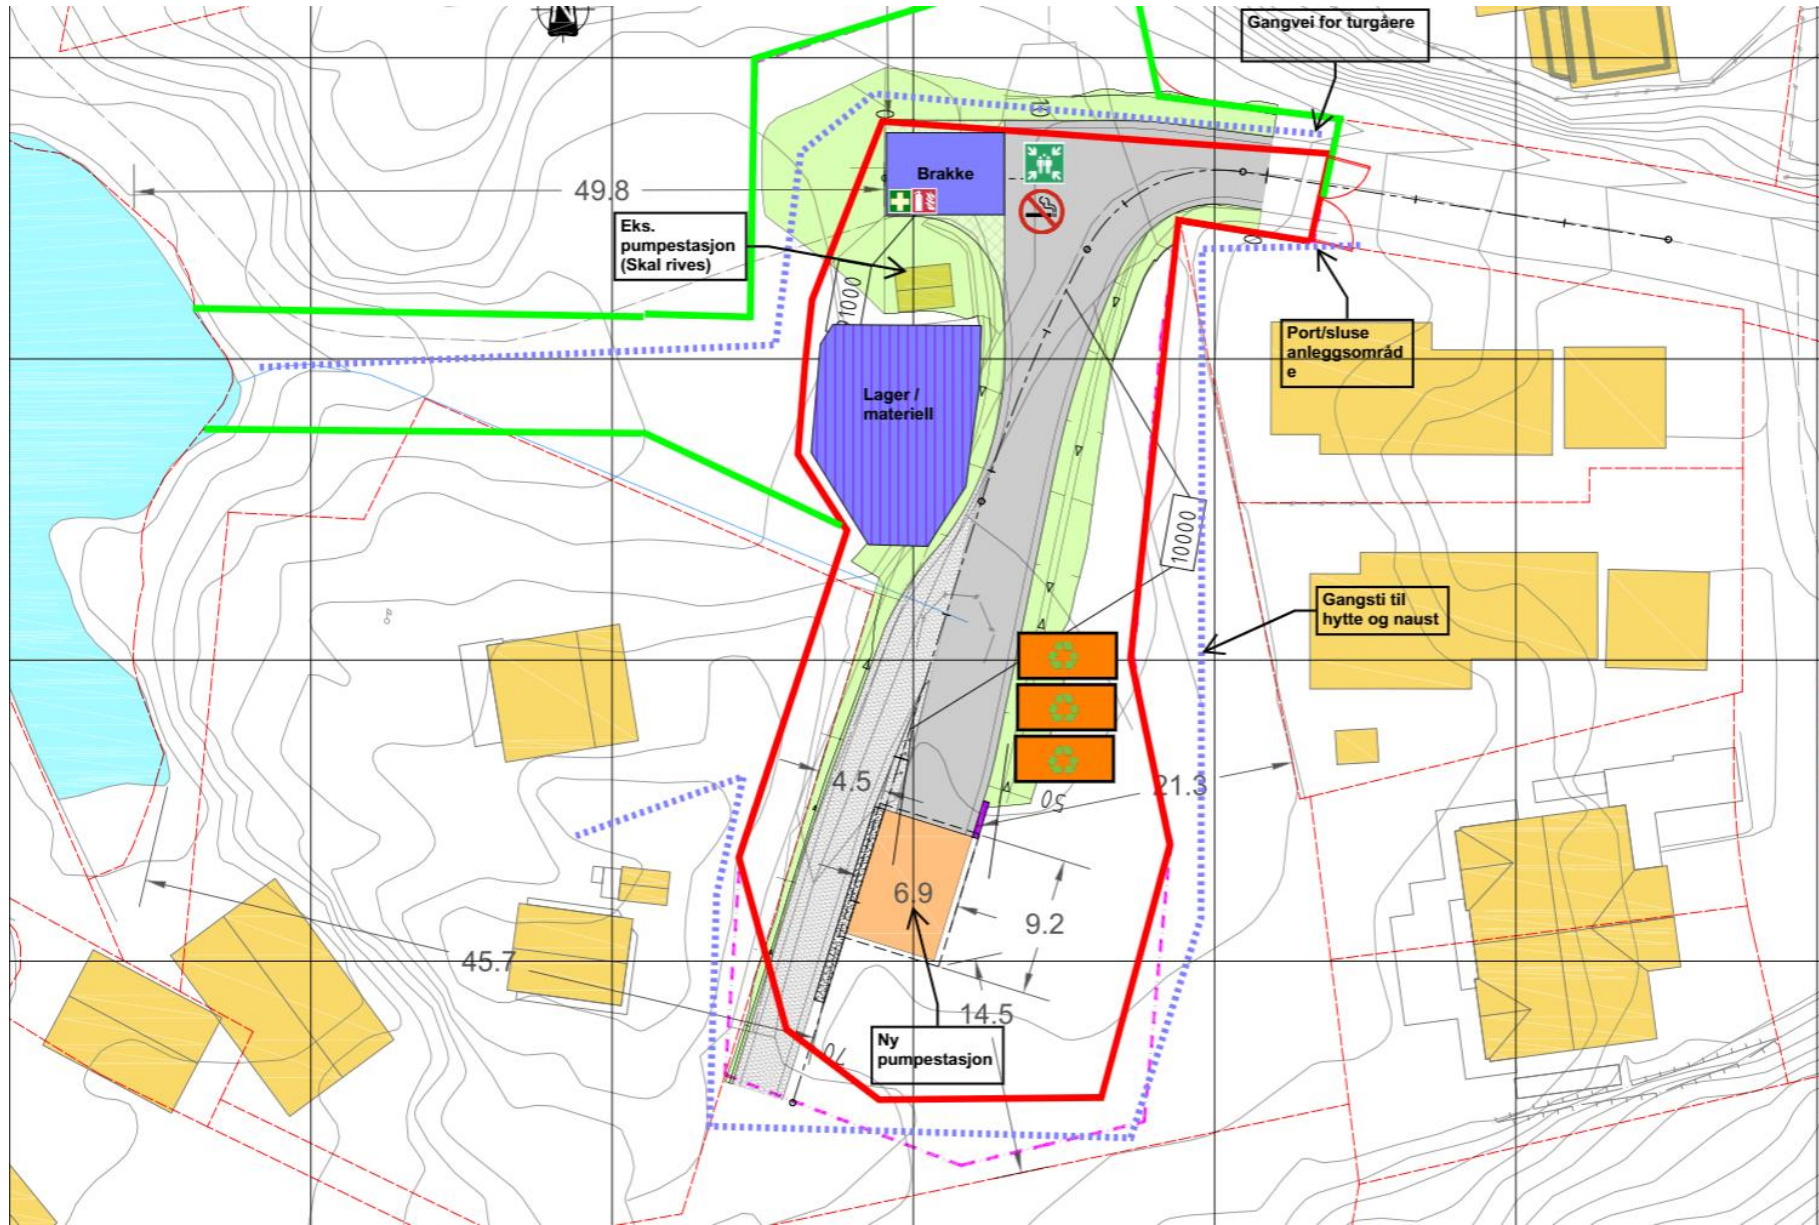



Pumpehus - Fremdrift

Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	jun	Kv 3, 2026			Kv 4, 2026			Kv 1, 2027			Kv 2, 2027			Kv 3, 2027			Kv 4, 2027		
					jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov
Kontraktuelle frister PA060 Hamnevik	153 dager	ma 01.03.27	fr 08.10.27																			
Bygg inkl. overflatebehandling klart for E64/E51	0 dager	fr 07.05.27	fr 07.05.27																			
Landtaksgrøft klare for E75 sine arbeider (Nødutslipp, pumpledning mot Kongshaugen RA)	0 dager	ma 01.03.27	ma 01.03.27																			
Klart til oppstart prøvedrift	0 dager	fr 08.10.27	fr 08.10.27																			
Entreprenørens fremdriftsplan - Pumpehus	160 dager	ma 07.09.26	fr 07.05.27																			
Opprigging og forberedende arbeider	5 dager	ma 07.09.26	ma 14.09.26																			
Utgraving av byggegrøp klart for betongstøp	15 dager	ma 14.09.26	ma 05.10.26																			
Støp av fundament pumpeump	5 dager	ma 05.10.26	ma 12.10.26																			
Montering av sumper, tanker og kobling av VA-anlegg	25 dager	ma 12.10.26	ma 16.11.26																			
Tilbakefylling og klargjøring for oppstart bygg	10 dager	ma 16.11.26	ma 30.11.26																			
Støp av bunnplate nytt bygg inkl. montering bæresystem i stål	15 dager	ma 30.11.26	ma 21.12.26																			
Tømrer- og snekkerarbeid	35 dager	ma 21.12.26	to 18.02.27																			
Montering av traverskran	8 dager	to 18.02.27	ti 02.03.27																			
VVS	10 dager	ti 02.03.27	ti 16.03.27																			
Sanitær	10 dager	ti 16.03.27	on 07.04.27																			
EL-arbeid	10 dager	on 07.04.27	on 21.04.27																			
Utenomhus	20 dager	to 18.02.27	to 18.03.27																			
Diverse kompletterende arbeider, overflate, mm.	12 dager	on 21.04.27	fr 07.05.27																			
Entreprenørens fremdriftsplan - Landtaksgrøft	78 dager	ma 30.11.26	on 07.04.27																			
Utvidelse riggområde til sjøkant	1 dag	ma 30.11.26	ti 01.12.26																			
Vegetasjonsrydding	5 dager	ti 01.12.26	ti 08.12.26																			
Grøftearbeid - klart til mottak E75	51 dager	ti 08.12.26	ma 01.03.27																			
Påkobling ledning E75	3 dager	ma 01.03.27	to 04.03.27																			
Lukking av grøft og gjenfylling	15 dager	to 04.03.27	fr 02.04.27																			
Nedrigg/ redusere riggområde	3 dager	fr 02.04.27	on 07.04.27																			

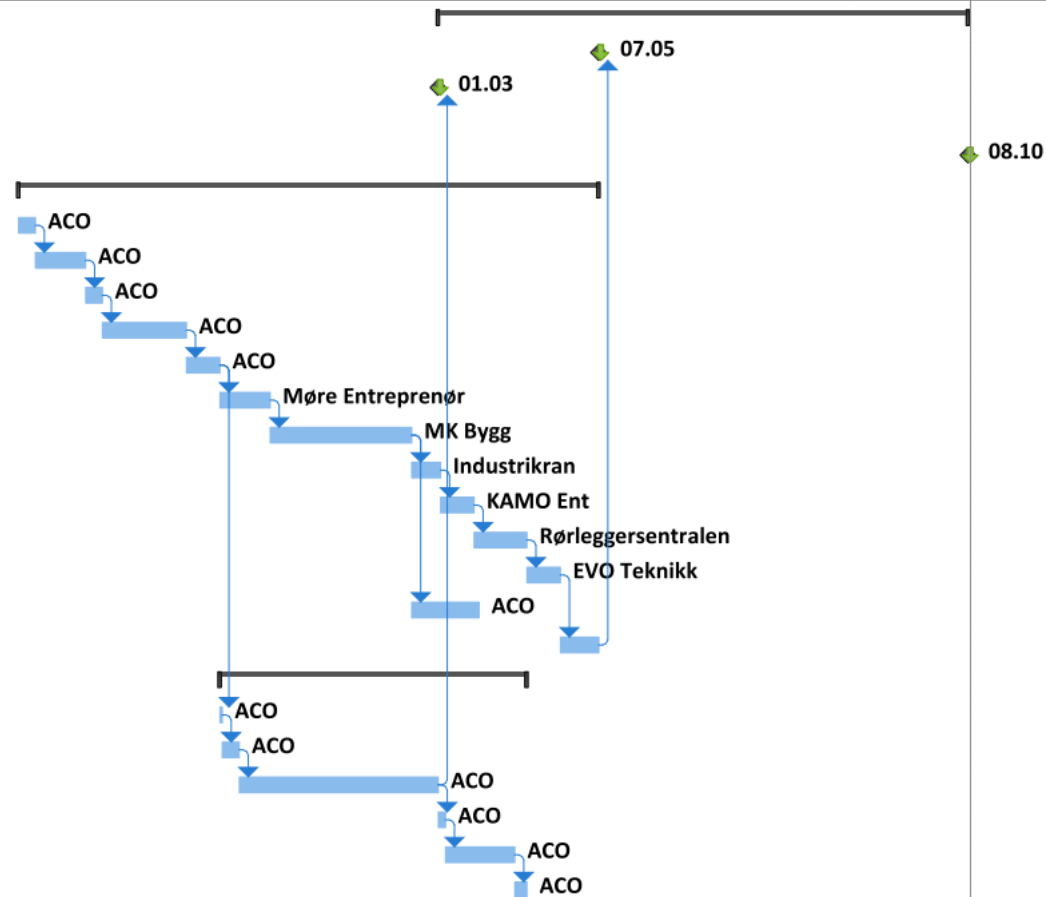



Pumpehus - ROS

Hensyn til berørte naboer

- Sikring av byggeplass mot 3. person. Anleggsgjerde, skilting
- Anleggstransport gjennom boligstrøk – Trafikksikkerhetsinstruks.
- Støvende arbeider – Kosting, spyling av anleggsmaskiner.
- Sprengningsarbeider – Varsling, bygningsbesiktigelser.
- Støyende arbeider, tidsbegresninger.



Pumpehus – Takk for oss

Spørsmål?

Byggeleder Frank Hide tlf: 986 23 034
