


E75 Sjøledninger Kongshaugen




Infomøte 11.09.2025

Prosjektgjennomføring

- Sjukenesstranda 100, v/ASKO
- Hoveddelen av arbeidet utføres på denne lokasjonen



- Rør leveres i 500 meters lengder
- Lagringsplass for rør vil være grønt område
- Rørene vil dras over flåten ved riggområdet hvor det monteres lodd på ledningen.
- Sveises hver 500m
- Forankres i moringer ved blå linje fortløpende som lengden utvides.
- Rør markeres med flagg og lys for å hindre ulykker.
- Rør sveises og belastes i sin helhet før de slepes ut i trasé og senkes.

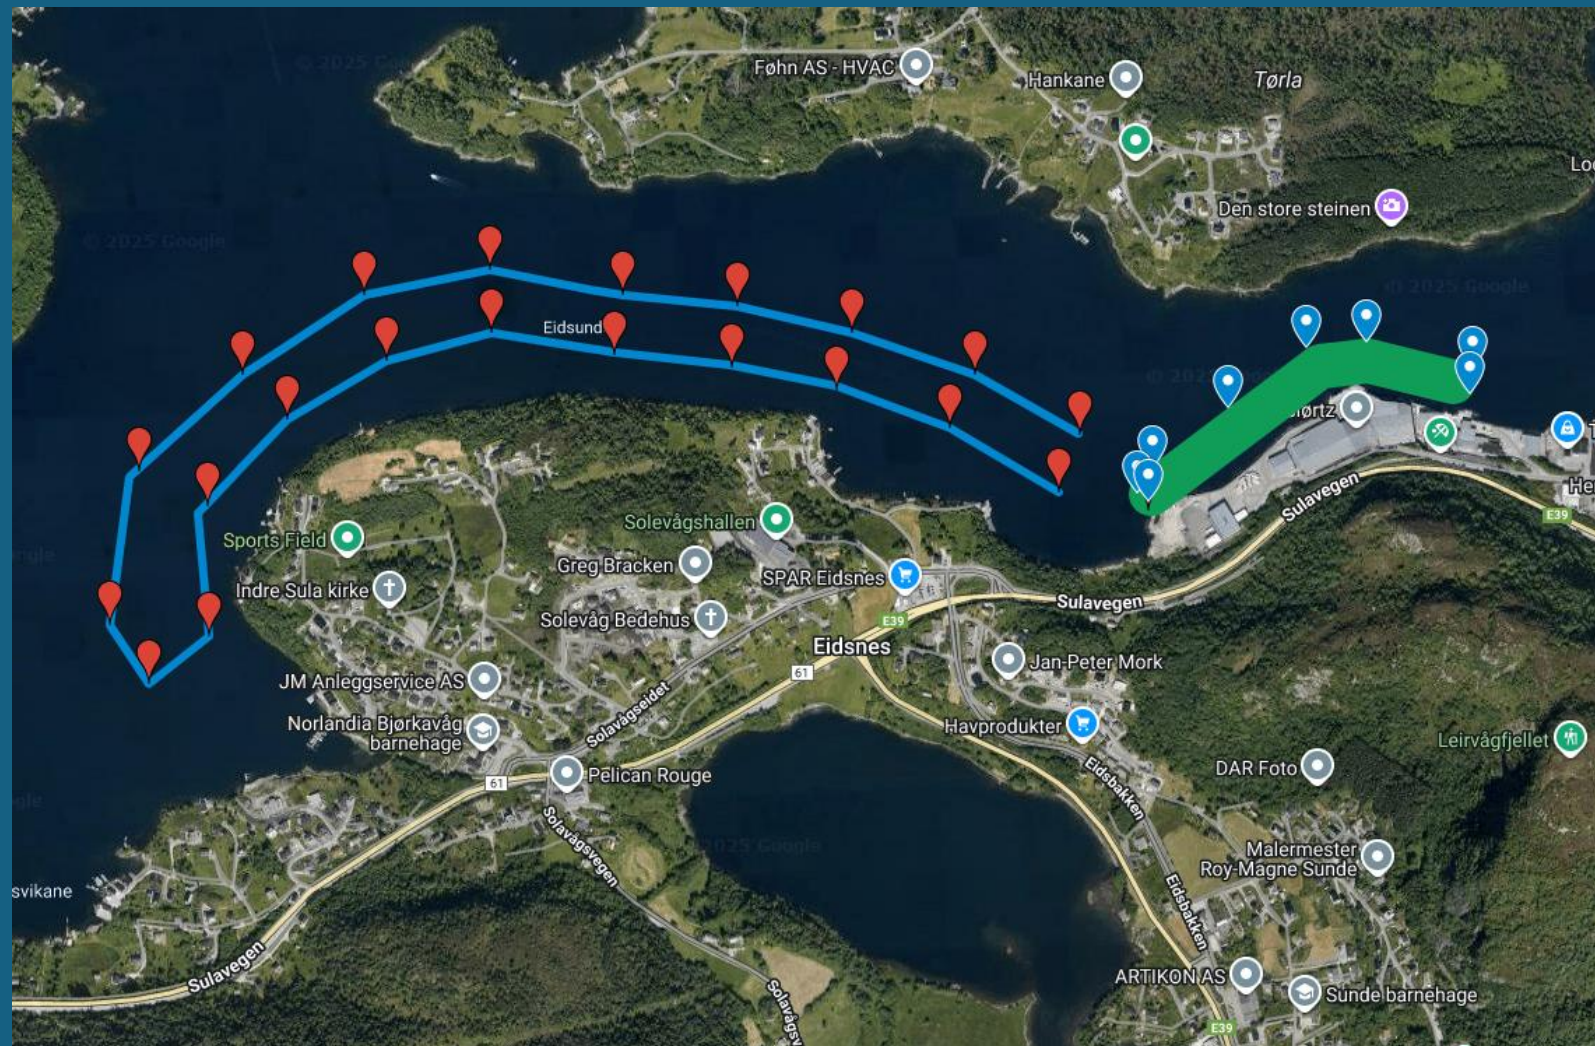

Ledninger som skal ferdigstilles i 2025

412 Nødutslippsledning Kongshaugen RA

- 160 m ledning
- Dimensjon Ø710mm
- Planlagt utslep og senking i uke 39

413 Utslippsledning Kongshaugen RA


- 1530 m ledning
- Dimensjon Ø800mm
- Planlagt utslep og senking i uke 41

442 Vannledning Vegsundstranda - Kongshaugen

- 950 m ledning
- Dimensjon Ø225mm
- Planlagt utslep og senking i uke 43

451 Sjøledning Stafsetneset - Kongshaugen

- 1410 m ledning
- Dimensjon Ø710mm
- Planlagt utslep og senking i uke 45

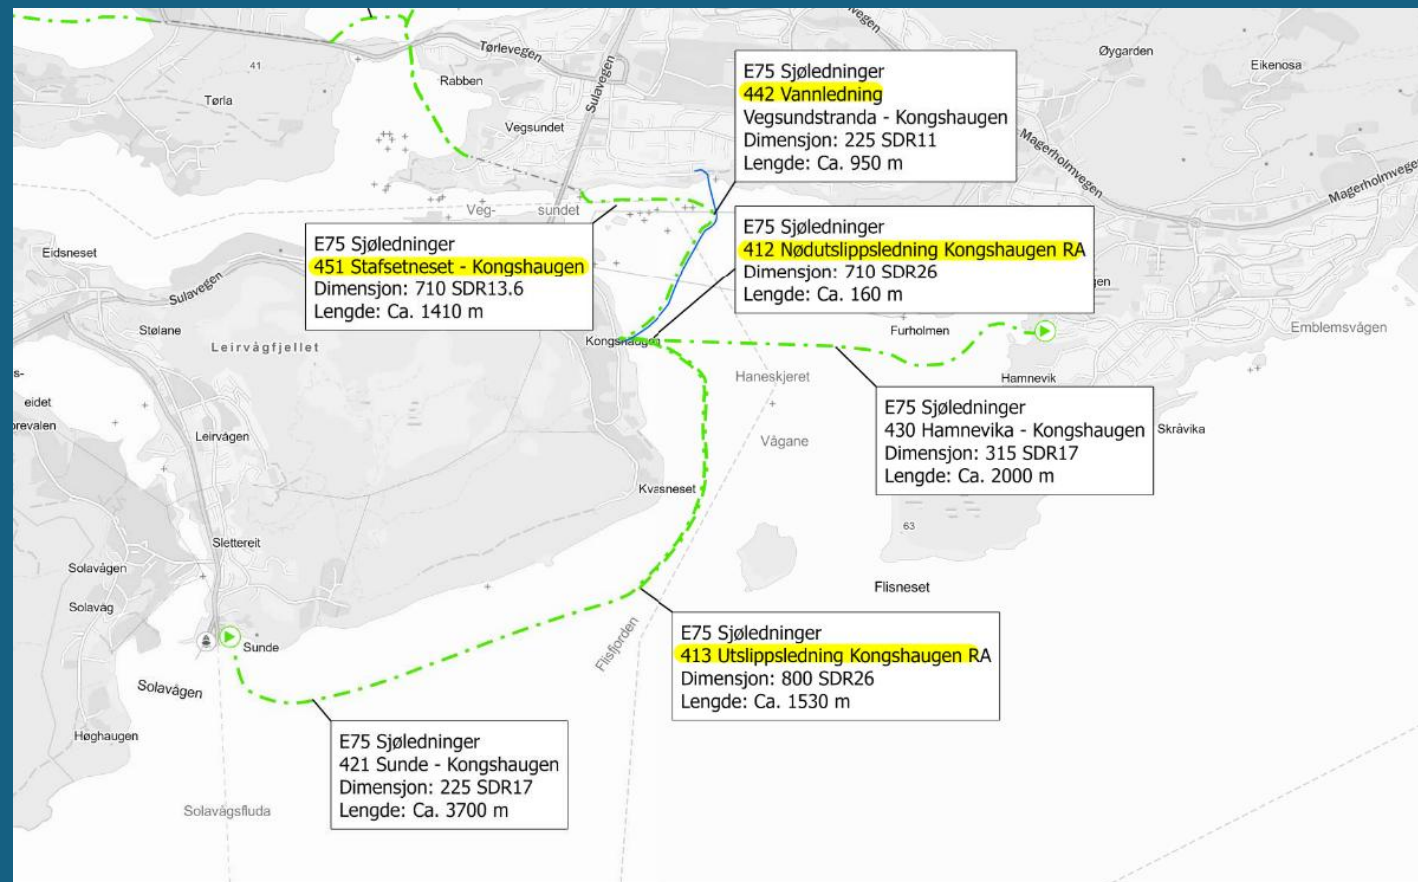



Bilde 1: Arbeider med belastning



Bilde 2: Senking av ledning



Bilde 3: Utslep av ledning
