

BLÅ

- fjordar for framtida


Ålesund kommunestyre 24.09.2026

Status renseanlegg

Berghall 1:

- Forsedimentering ferdig til montasje av Maskin- og prosessutstyr
- For sand- og fettfang pågår betongarbeider

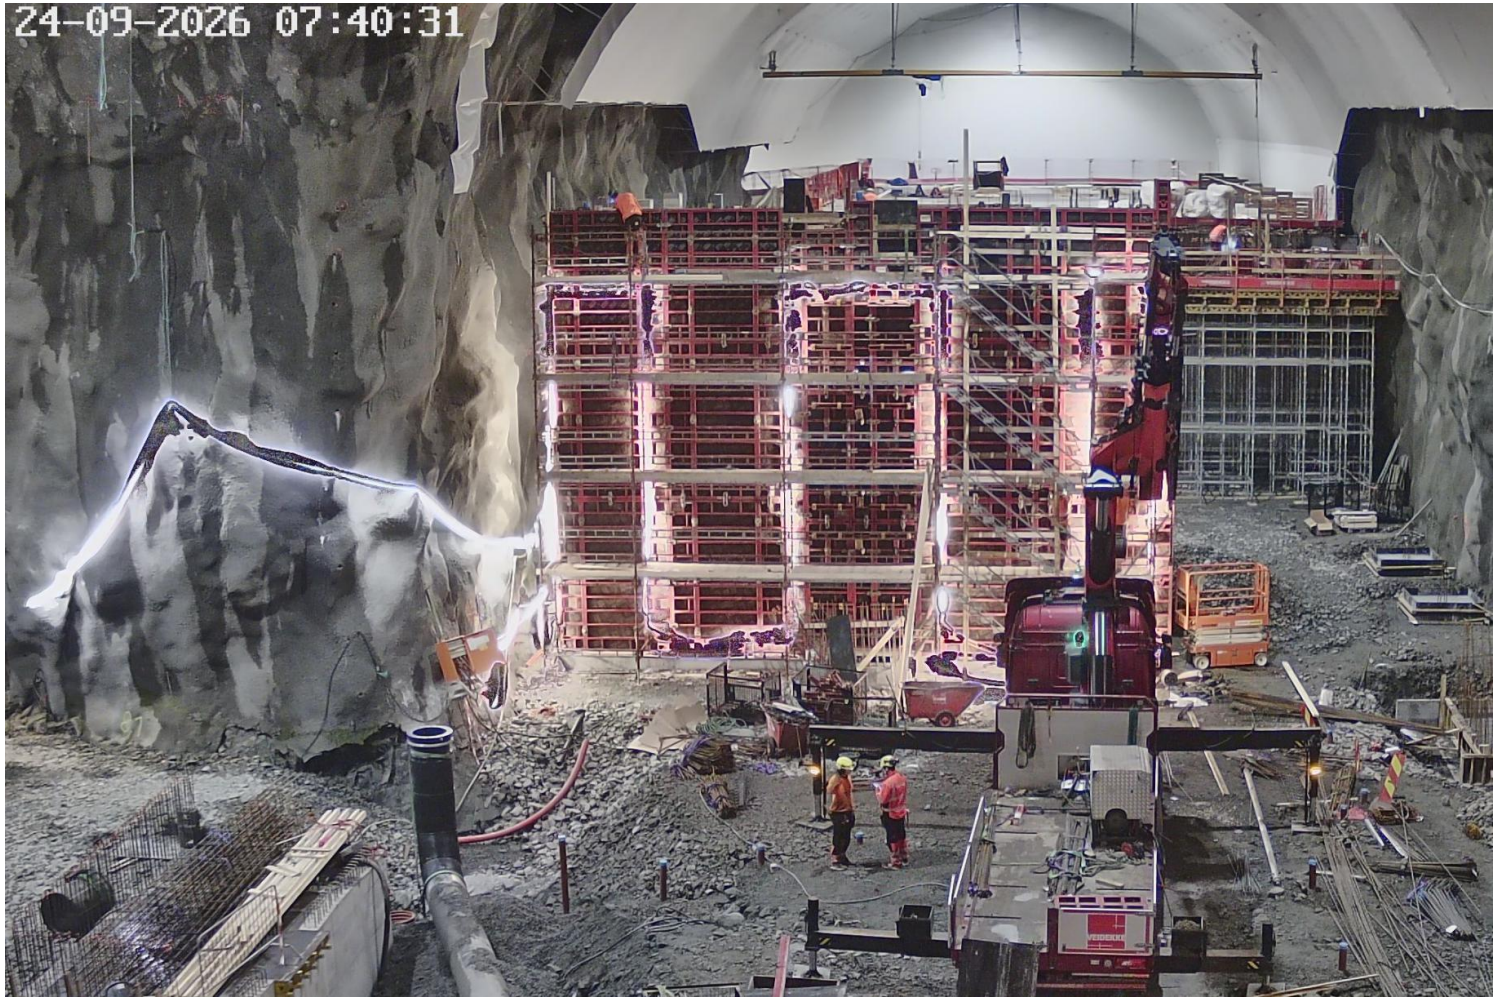


24-09-2026 07:40:31





Status renseanlegg

Berghall 2:

- Montasje Maskin- og prosessutstyr startet 15 september.
- MBBR ferdig støpt
- Flotasjon; bassengene ferdig støpt.
- Konstruksjoner for område Slambehandling påbegynt.



Status renseanlegg

<u>Berghall 2:</u>

- Alle rensebassenger er tette bassenger med støpt plate over bassengene.
- Det etableres så lyst og trivelig som mulig.








Pipe

- Ferdig montert august




Status overføringsanlegg

- **Blå ovale ringer:**
  Pågående byggeaktivitet med anslått ferdiggrad
- **Grønn oval ring:**
  Snarlig oppstart
- **Landstrekk:**
  ca 80% ferdig, gule strekk gjenstår
- **Sjøledninger:**
  ila høsten 26: ca 90 prosent ferdig (5 ledningsstrekk i høst)

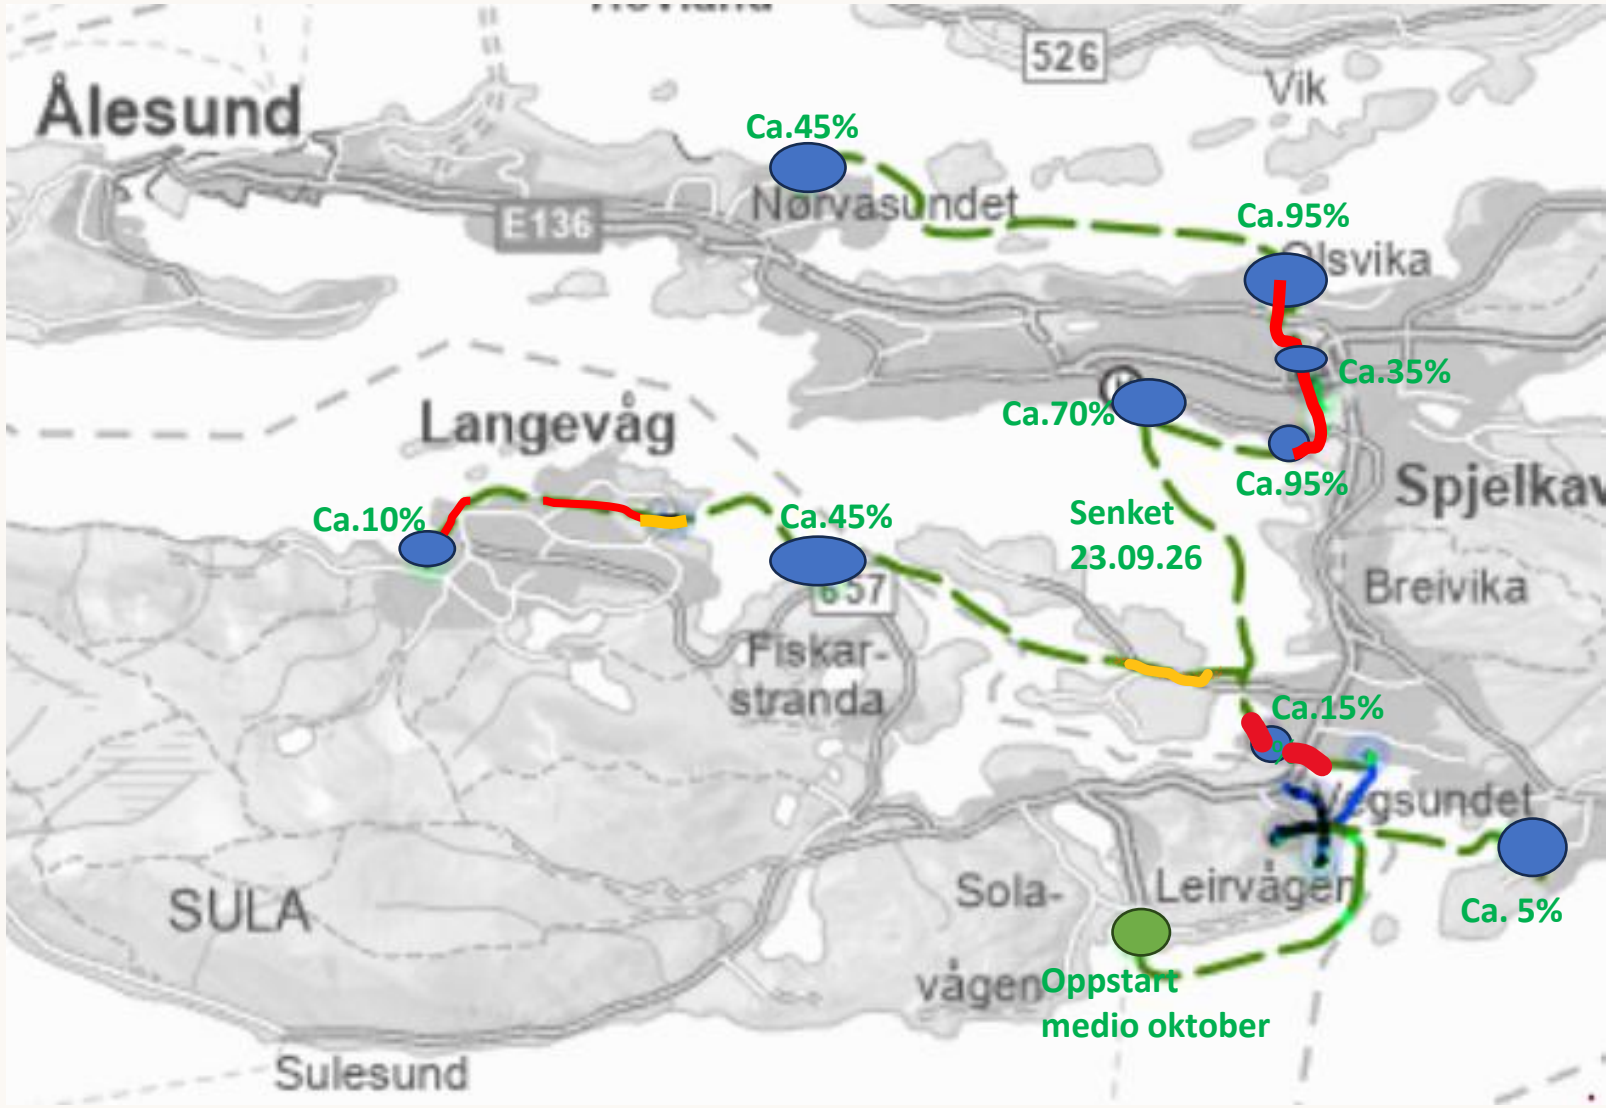

Sjøledninger

- Produseres i 500 meters lengder i Stathelle i Telemark
- Fløtes opp til Giørtz og sveises til riktige lengder der
- Belastes med betonglodd
- Fløtes til riktig posisjon for senking
- Senkes
- 5 strekk senkes i høst.

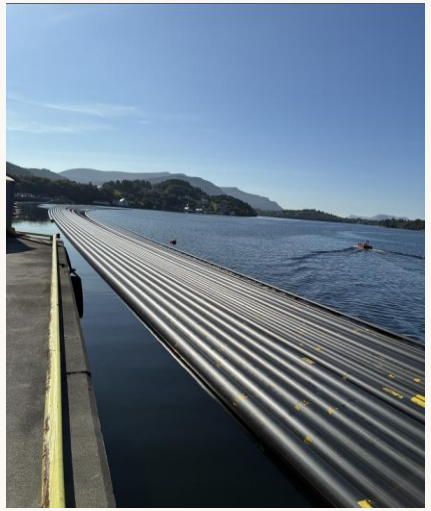



Landledninger

- Ledning over Moa, ca 2,5 km lang er ca 90% ferdig og ferdig før jul.
- Ledning på Sula, 80% ferdig, venter på arkeologisk utgraving for siste strekket.
- Ledning over Tørla kontraheres nå, sammen med MILSAM




Stafsethneset

- Ferdig ca 425 m langt borhull i fjell
- Ferdig boret 26.8.
- Rør i borehull ferdig trukket 10.09.
- Område lukket og tilbakeført til opprinnelig om ca tre uker.





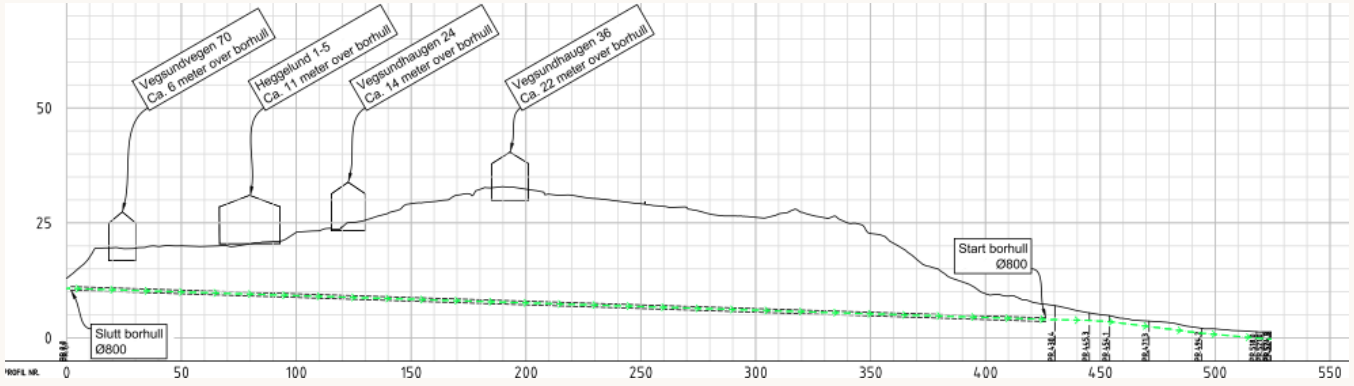

Breivika

- Stort sett ferdig bygd og montert alt utstyr.
- Mindre arbeid med testing og diverse gjenstår
- Omkoblingsjobb før fasing av vannet over til KRA i 2028





Åse

- Pumpestasjon etablert.
- Grøft for landtak etablert, graves frem uke 38.
- Mottak sjøledning 23. september og 7. oktober.
- Maskin og prosess har startet montasje innvendig i pumpestasjon.
- Omkoblingsjobb før fasing av vannet til KRA i 2028.






S-kurver og kostpådrag

Renseanlegget i berg:
Bokført fakturapådrag i 2026 på ca kr 219 MNOK til og med august.

Overføringsanlegget:
Bokført fakturapådrag i 2026 på ca kr 86,5 MNOK til og med august.


Totalprosjektet:
Bokført fakturapådrag i 2026 på ca kr 305,5 MNOK til og med august.

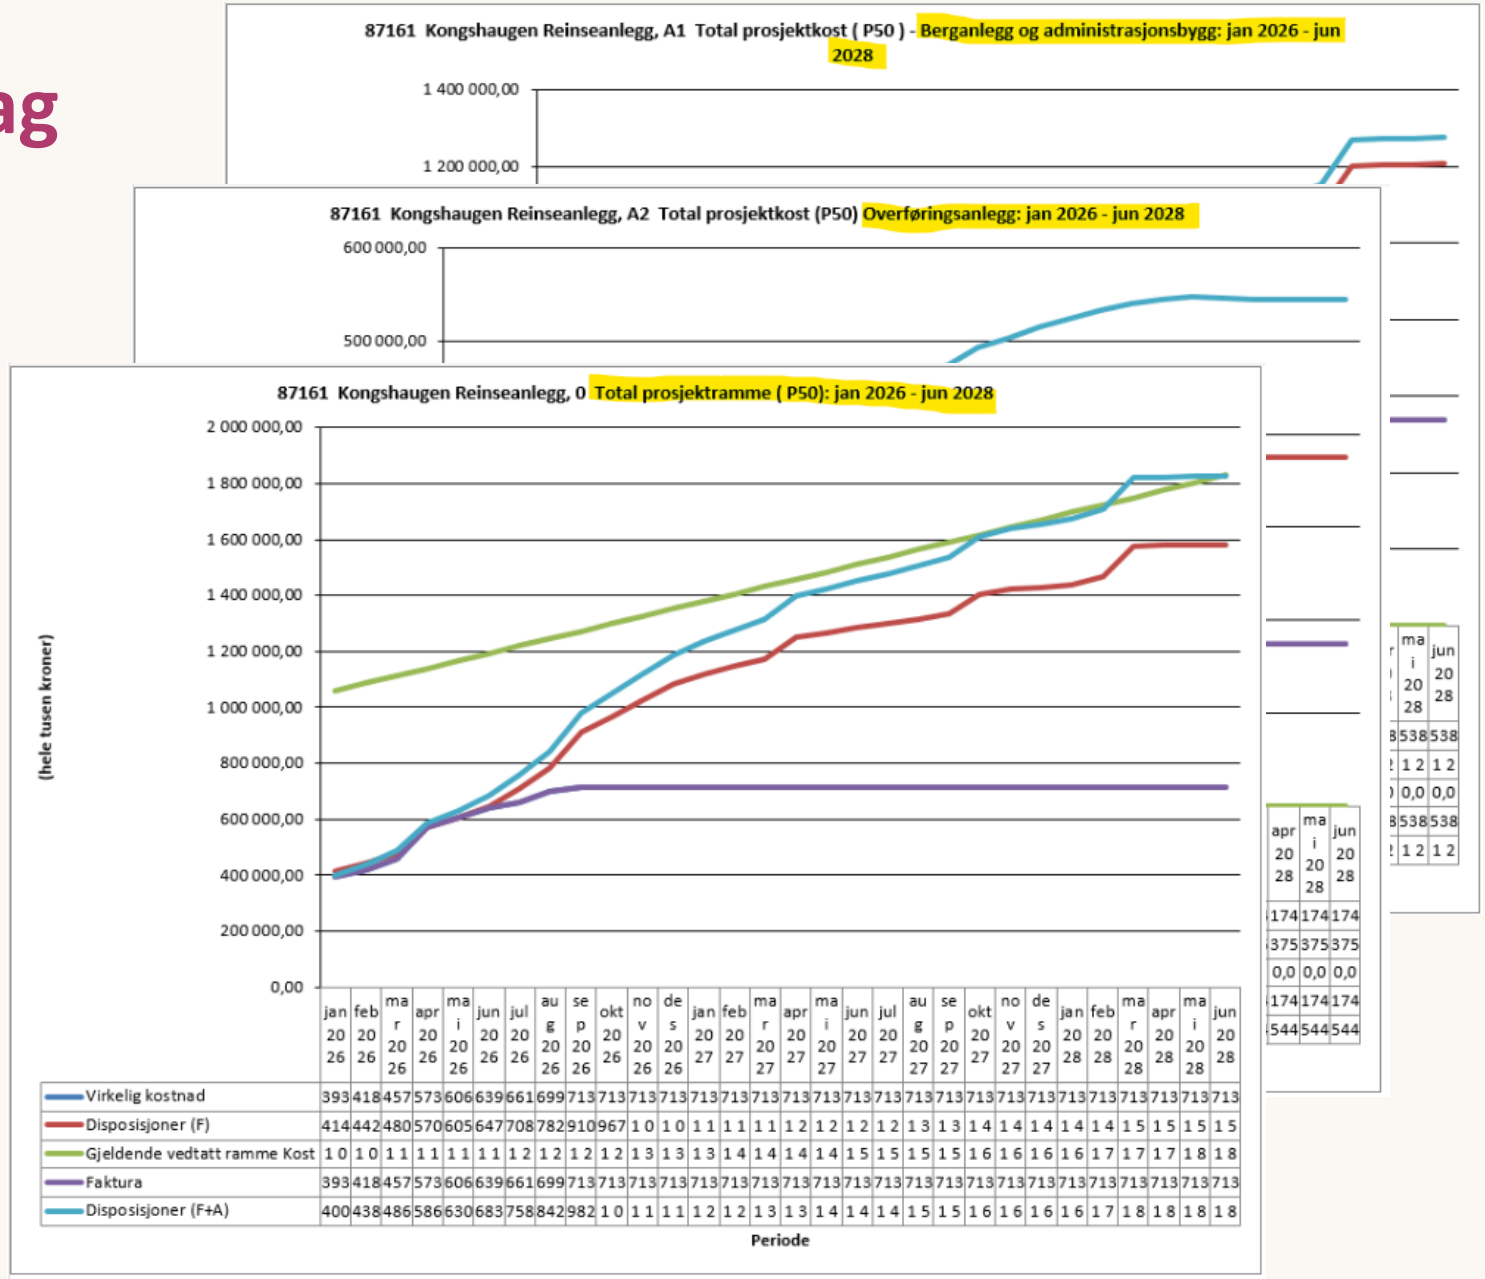

ÅLESUND KOMMUNE | SULA KOMMUNE

Kostpådrag, totalt


- Totalt fakturapådrag til dags dato er ca kr 780 MNOK.
- Aktiviteten er stor og derfor også fremtidig kostnadspådrag frem mot ferdigstilling alle områder

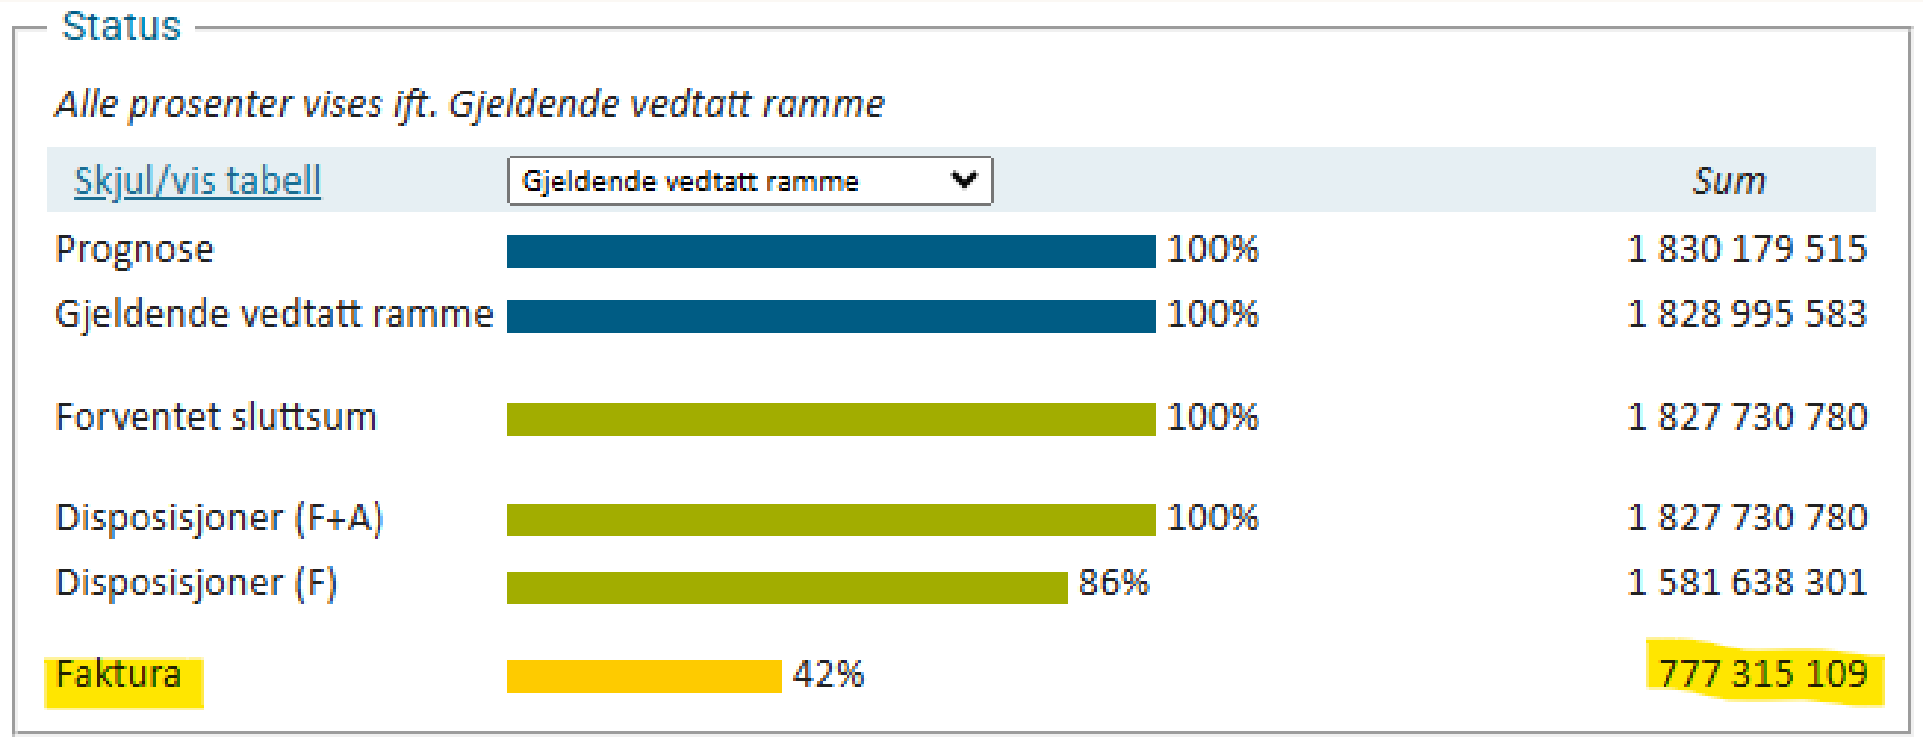

P50-budsjett

- Forprosjekt
- Usikkerhetsanalyse
- Styres iht vedtatt i budsjett- og økonomiplanvedtak 2022
- Tilfredsstillende reserve ift å holde seg innenfor P50-budsjettet

- **Innenfor vedtatt budsjettramme**

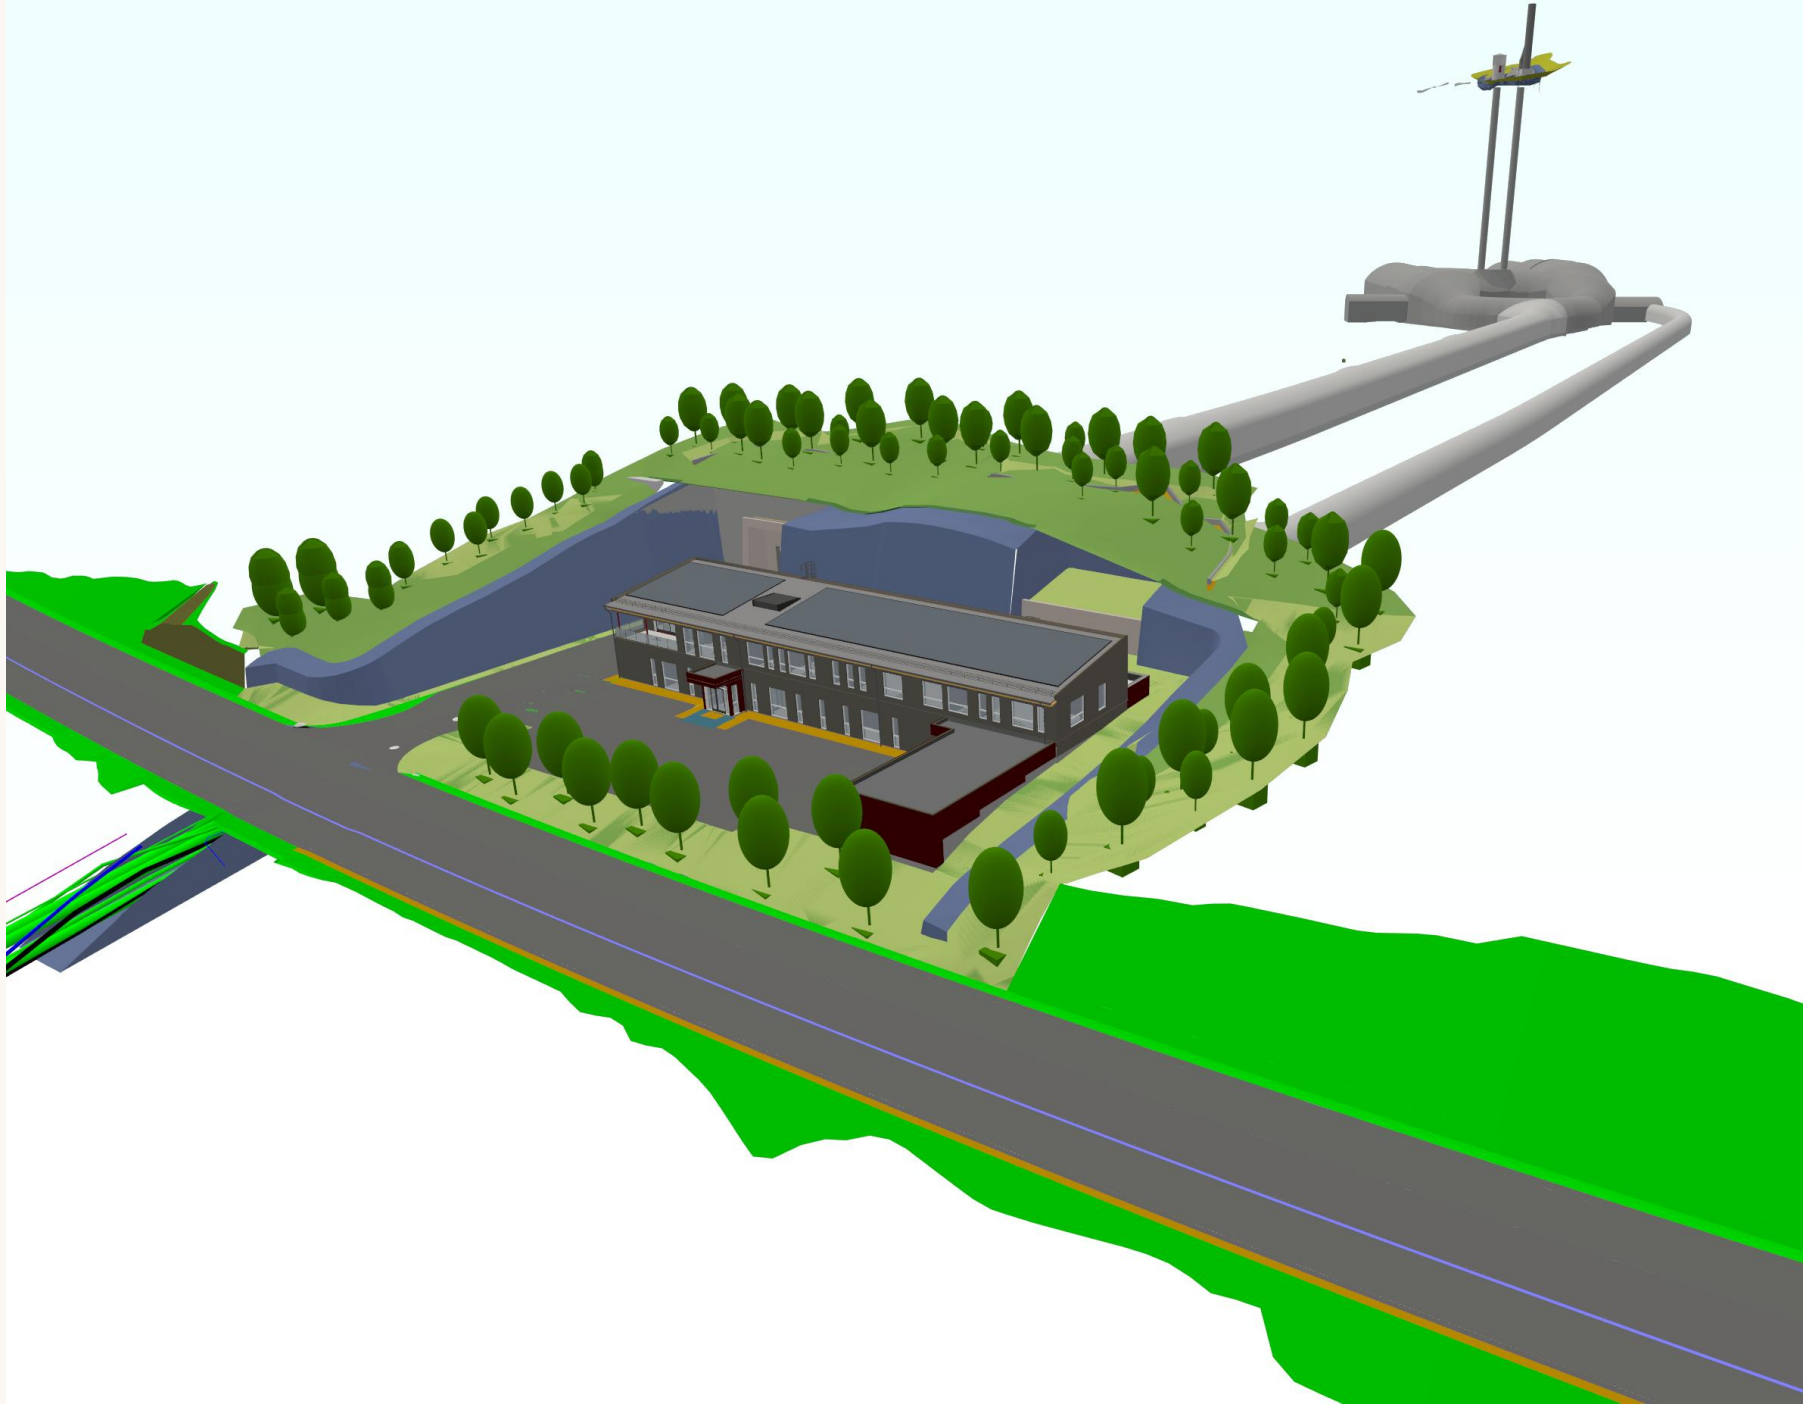

Fremdrift videre

- Pumpestasjon Sunde, oppstart oktober
- Administrasjonsbygget ila november
- Sjø- og landledninger utover vinteren
- Igangsetting og prøvedrift Q1 og Q2-2028

- **Innenfor planlagt tidsramme**

